


RISK ASSESSMENT




THE DEFINITION OF RISK

“Segala sesuatu yang dapat menghambat untuk pencapaian tujuan ”

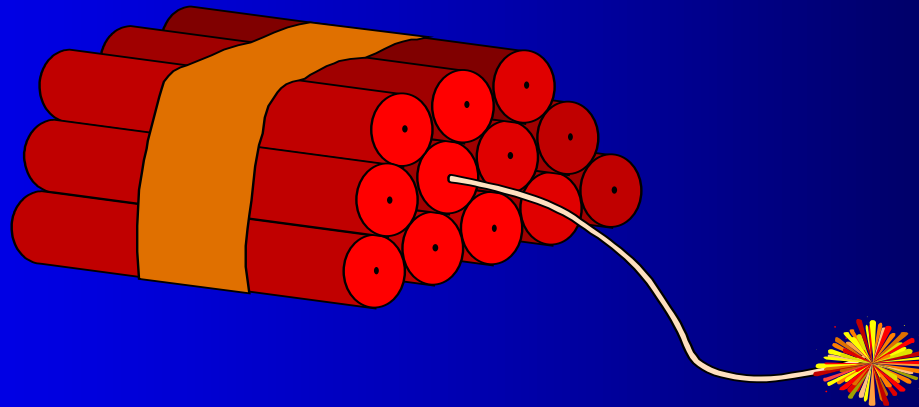

RISK ASSESSMENT

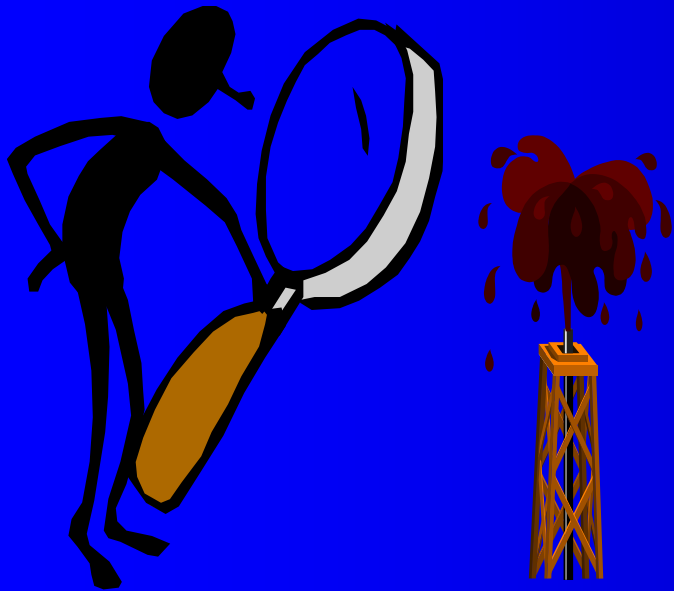

- ❖ IDENTIFIKASI RISIKO
- ❖ PENGUKURAN RISIKO
- ❖ PRIORITAS RISIKO

PENGUNAAN MATRIK RISIKO

- ❑ Siapkan Matrik Komponen dan Risiko
- ❑ Tentukan Bobot Masing-Masing Sub Jenis Risiko
- ❑ Tentukan Skala Tingkat Risiko Pada Masing-Masing Komponen
- ❑ Hitung Nilai Tertimbang Dari Setiap Risiko Pada Masing-Masing Komponen
- ❑ Susun Ikhtisar Risiko Untuk Masing-Masing Komponen.

PERENCANAAN AUDIT INDIVIDU BERBASIS RISIKO

- ❑ Pemahaman atas tujuan/target bisnis/operasi dari obyek atau unit audit.
- ❑ Pemahaman dan analisis terhadap komponen utama dari obyek atau unit audit yang berperan penting dalam mencapai tujuan/target yang ditetapkan.
- ❑ Lakukan analisis risiko yang menjadi ancaman terhadap pencapaian tujuan.
- ❑ Buatlah matrik risiko
- ❑ Buatlah daftar urutan risiko dari yang tertinggi sampai yang terendah

KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA - CONTOH

TUJUAN:

Pengadaan barang dan jasa secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas.

KOMPONEN UNIT:

- a. Penentuan kebutuhan barang dan jasa
- b. Penunjukkan penyedia barang dan jasa
- c. Pembuatan Kontrak Pengadaan
- d. Penerimaan barang

KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA - CONTOH

JENIS RISIKO:

1. Risiko aset : Informasi dan komunikasi tidak lancar
SDM tidak kompeten
Dana/ Keuangan tidak mendukung
2. Risiko lingkungan: Perubahan teknologi yang cepat
Perubahan kebijakan pemerintah
Kelangkaan pasokan/ harga tdk stabil
3. Risiko ancaman: Korupsi kolusi dan nepotisme (KKN)
Pengelembungan harga (*mark-up*)
Spesifikasi barang/jasa yg rendah mutunya

KEGIATAN PENGADAAN BARJAS

MATRIKS DATA AWAL

KOM-PONEN	R I S I K O								
	Aset (0,30)			Lingkungan (0,20)			Ancaman (0,50)		
	Info	SDM	Dana	Tekno	Kebijk	Pasok	KKN	Markup	Mutu
	(0,35)	(0,25)	(0,40)	(0,35)	(0,45)	(0,20)	(0,40)	(0,50)	(0,10)
Penentuan Kebutuhan	5	3	2	2	4	3	3	1	2
Penunjukan Pemasok	4	4	1	1	3	2	4	1	1
Pembuatan Kontrak	3	5	2	1	4	1	4	5	3
Penerimaan Barang	2	4	5	1	2	2	5	4	1

16/07/2023

budiman_sl@yahoo.com

8

KEGIATAN PENGADAAN BARJAS

MATRIKS NILAI TERTIMBANG (1)

KOM-PONEN	R I S I K O								
	Aset (0,30)			Lingkungan (0,20)			Ancaman (0,50)		
	Info	SDM	Dana	Tekno	Kebijk	Pasok	KKN	Markup	Mutu
	(0,35)	(0,25)	(0,40)	(0,35)	(0,45)	(0,20)	(0,40)	(0,50)	(0,10)
Penentuan Kebutuhan	1.75	0.75	0.80	0.70	1.80	0.60	1.20	0.30	0.20
Penunjukan Pemasok	1.40	1.00	0.40	0.35	1.35	0.40	1.60	0.50	0.10
Pembuatan Kontrak	1.05	1.25	0.80	0.35	1.80	0.20	1.60	2.50	0.30
Penerimaan Barang	0.70	1.00	2.00	0.35	0.90	0.40	2.00	2.00	0.10

16/07/2023

budiman_sl@yahoo.com

9

KEGIATAN PENGADAAN BARJAS

MATRIKS NILAI TERTIMBANG (2)

KOM-PONEN	R I S I K O					
	Aset (0,30)		Lingkungan (0,20)		Ancaman (0,50)	
	Jumlah	Tertimbang	Jumlah	Tertimbang	Jumlah	Tertimbang
Penentuan Kebutuhan	3.30	0.99	3.10	0.62	1.90	0.95
Penunjukan Pemasok	2.80	0.84	2.10	0.42	1.10	1.10
Pembuatan Kontrak	3.10	0.93	2.35	0.47	4.40	2.20
Penerimaan Barang	3.70	1.11	1.65	0.33	4.10	2.05

KEGIATAN PENGADAAN BARJAS

MATRIKS NILAI TERTIMBANG (3)

	R I S I K O				
KOMPONEN	Aset (0,30)	Lingkungan (0,20)	Ancaman (0,50)	NILAI AKHIR	
	Jumlah tertimbang	Jumlah tertimbang	Jumlah tertimbang	Total	Urutan
Penentuan Kebutuhan	0.99	0,62	0,95	2,56	3
Penunjukan Pemasok	0.84	0.42	1.10	2.36	4
Pembuatan Kontrak	0.93	0,47	2.20	3,60	1
Penerimaan Barang	1,11	0,33	2,05	3.49	2

KEGIATAN PENGADAAN BARJAS

MATRIKS JUMLAH NILAI TERTIMBANG

Misal: waktu audit 80 jam

Komponen	Nilai	%	Alokasi waktu audit
Penentuan Kebutuhan	2.56	21.32	17.10
Penunjukan Pemasok	2.36	19.65	15.70
Pembuatan Kontrak	3.60	29.97	24.00
Penerimaan Barang	3.49	29.06	23.20
Jumlah	12.01	100,00	80,00

16/07/2023 budiman_sl@yahoo.com 12
